

2015  
全国版

# 上出来 *BEST* 8



## 現場日報システム 操作手順書


## 【目次】

- 1. タイトルの作成 ..... (2-3)
- 2. 実行予算の作成 ..... (4-10)
- 3. 日報(実績数量)の入力 ..... (11-13)
- 4. 確認画面 ..... (14)

# 【1. タイトルの作成】



「現場日報管理」システムを起動します。



画面左上「新規作成」ボタンをクリックします。

下図のウィンドウが開くので、「タイトル」「契約日」「工期開始」「工期終了」「契約金額(税別)」を入力してください。

(一旦登録した後、修正がある場合は画面上「修正」ボタンを押すしてください)

工事設定


工事No.	0013	契約日	H27/04/01
作成日	H27/07/07	工期開始	H27/04/01
工事名(1)	平成26年度 サンプル工事	工期終了	H27/12/31
工事名(2)		契約金額	2,000,000 円
タイトル	当初予算	契約変更金額	円
工事場所			
請負者	コリンズテクリス・サンプル建設JV		
現場代理人	個利手句一 担当者 個利手句一		
発注者			
監督員	発注 太郎		

メモ欄


工程データ取込み

OK 登録 戻る

# 【1. タイトルの作成】



タイトルを作成後、画面上「環境設定」をクリックしてください。

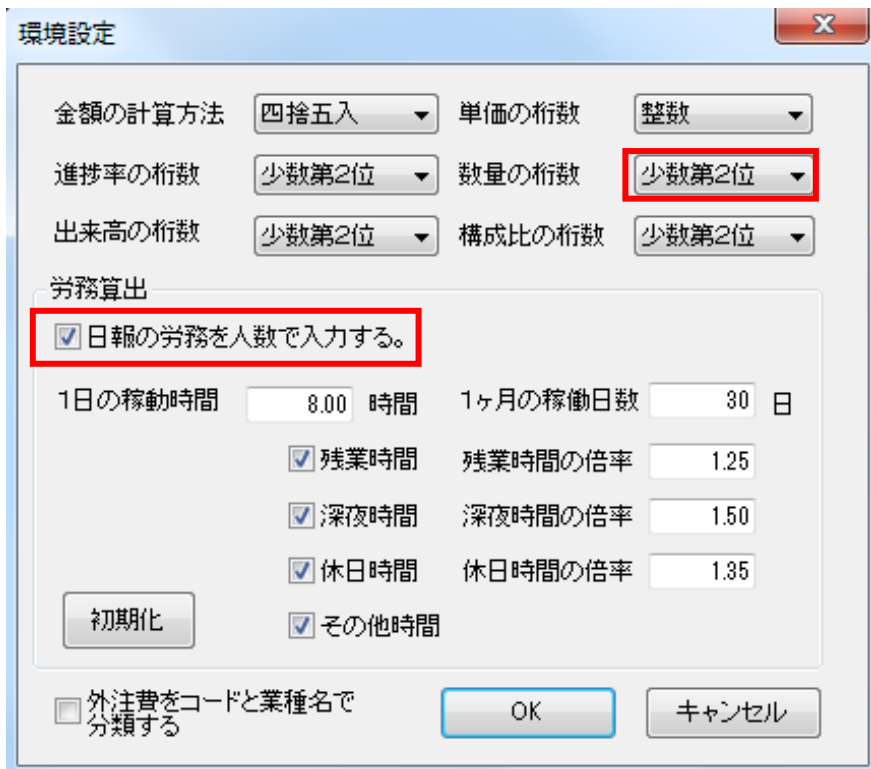


ウィンドウが開くので、左のように数量の桁数を「少数第2位」にしてください。

また、労務算入の入力方法についてチェックを入れます。

・原価管理をメインに行いたい場合は、「日報の労務を人数で入力」にチェックを入れます。

・日報管理をメインで行いたい場合は、時間あたりの労務算出を行います。



※このマニュアルでは「日報の労務を人数で入力」します。

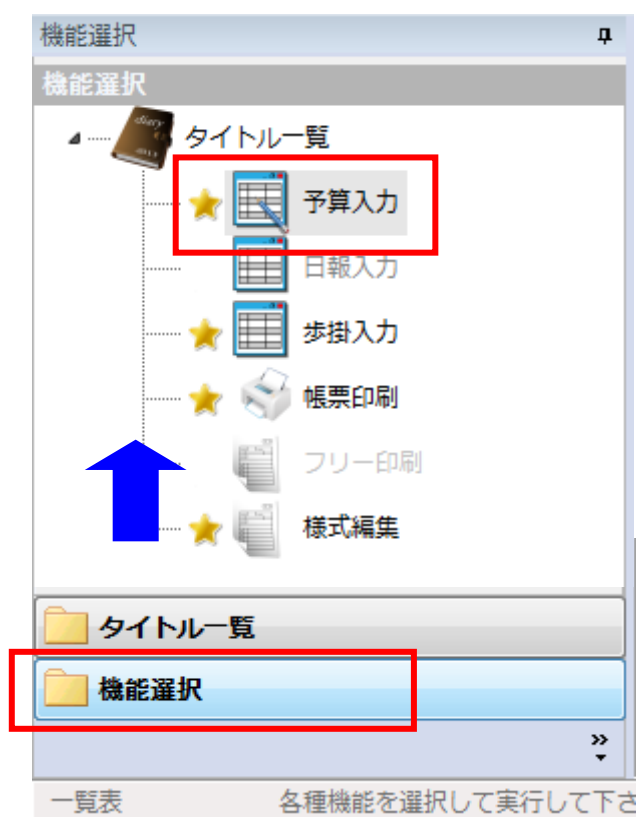

環境設定終了後、画面左下「機能選択」をクリックし、「予算入力」画面へ移動します。

## 【2. 実行予算の作成】

予算入力を行います。画面上「予算取り込み」ボタンから、積算データまたは、工種ツリーを読み込むことができます。

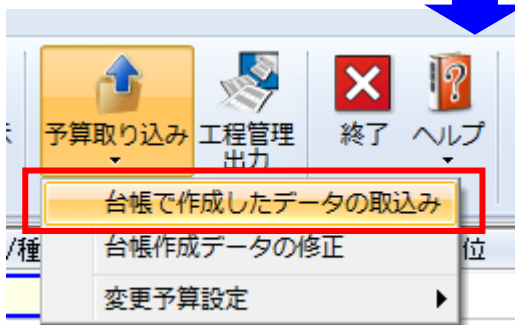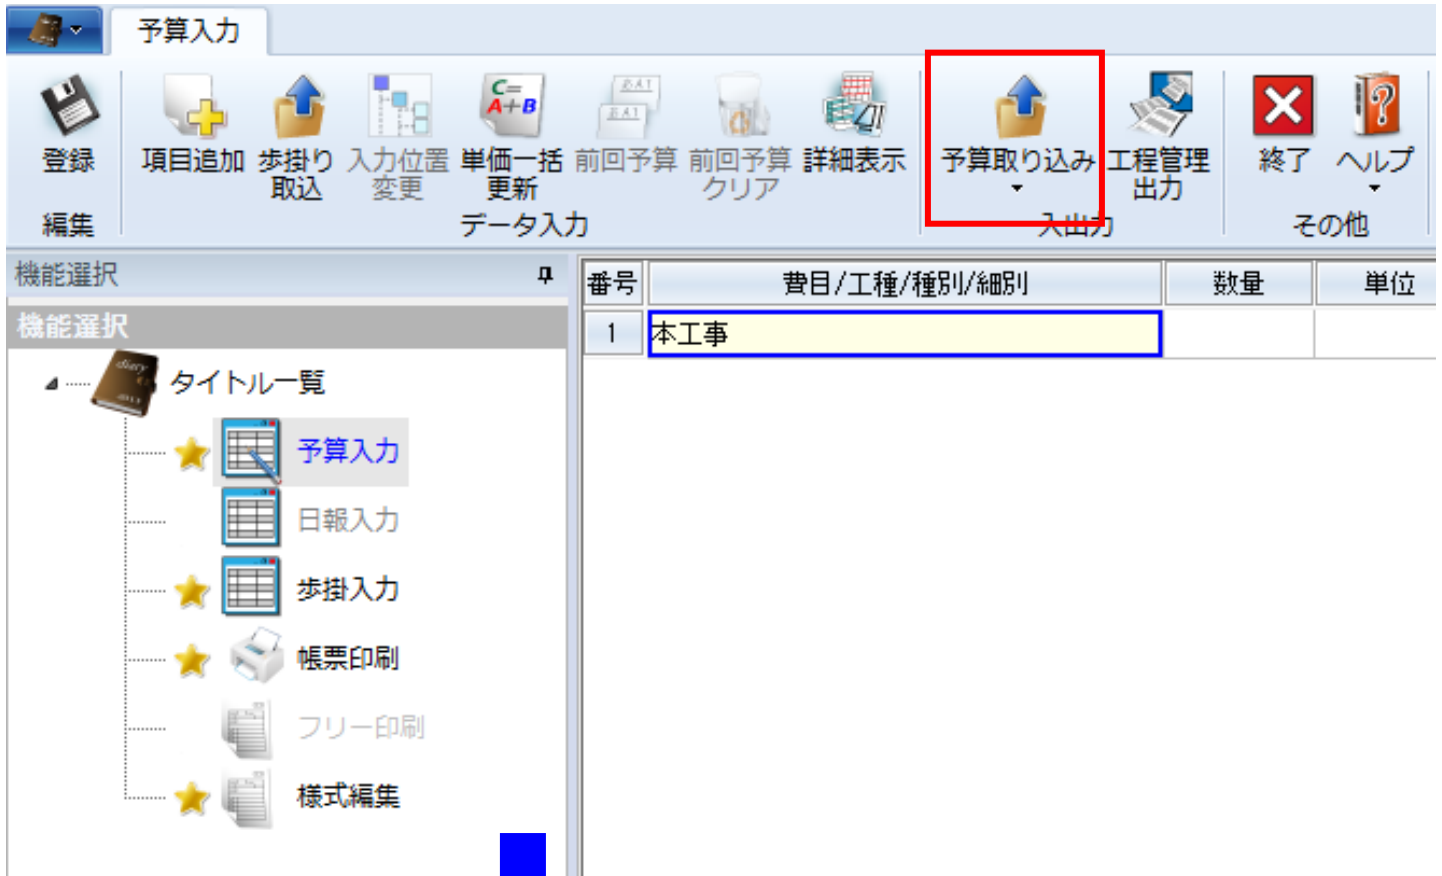

予め「台帳管理」にて積算データ等を利用した「工種作成」を行っておくと、「台帳で作成したデータの取込み」が可能です。

「工種作成」機能については、別紙の「工種作成(積算データ活用及び工種体系ツリー活用)マニュアル」を参考にしてください。

### 【工種作成機能とは？】

各社積算システムから出力されたデータを利用し、施工管理基準の絞り込みや、材料、労務、機械、工事概要などのデータ(数値)利用が可能です。また、積算データが無い場合であっても、設計書を元に、工種ツリーや施工管理基準の絞り込みが可能です。



## 【2. 実行予算の作成】

台帳で作成のファイル取込み

道路改良(0)

- 道路土工(1式)
- 掘削工(1式)
  - 掘削(200 m3)
- 路体盛土工(1式)
  - 路体(築堤)盛土(1800 m3)
- 路床盛土工(1式)
  - 路床盛土(1000 m3)
- 路肩盛土工(1式)
  - 路肩盛土(700 m3)
- 法面整形工(1式)
  - 法面整形(切土部)(500 m2)
  - 法面整形(盛土部)(500 m2)
- 法面工(1式)
- 植生工(1式)
  - 植生シート(300 m2)
- 排水構造物工(1式)
- 作業土工(1式)
  - 床掘り(200 m3)
  - 埋戻し(100 m3)
- 側溝工(1式)
  - プレキャストU型側溝(120 m)
  - プレキャストU型側溝(100 m)
  - プレキャストU型側溝(50 m)
  - プレキャストU型側溝(20 m)
  - 側溝蓋(240 枚)
  - 側溝蓋(150 枚)

番号	属性	名称	数量	単位
1	機械	バックホウ(クローラ型...	0.80	供用日
2	材料	軽油 バトロール給油小...	71.40	㍓
3	労務	特殊運転手 8時間当り	0.60	人
4	材料	調整額	1.00	式

環境設定

マスター処理

マスターの単価を変更しないで既存の単価を使用する。

マスターの単価も修正する。

キャンセル OK

要素修正 設定 キャンセル 実行

数量、単価の桁数は一覧表画面の環境設定により変更して下さい。

「台帳で作成したデータの取込み」を行うと、左のウィンドウが開きます。

積算データを利用している場合は、各歩掛の要素(労務・機械・材料・外注)も反映されます。

ウィンドウ下の「設定」ボタンから取り込んだ要素をマスターに登録するかどうかの設定を行うことが可能です。

「実行」ボタンを押すと、工種ツリー、数量、単位、単価(各歩掛の要素)、金額の情報が反映されます。

番号	費目/工種/種別/細別	数量	単位	単価	合計	備考
1	本工事				¥11,183,830	
2	費 道路改良				¥11,183,830	
3	工 道路土工	1	式		¥1,454,050	
4	種 掘削工	1	式		¥95,485	
5	細 掘削	200	m3	477	¥95,485	
6	種 路体盛土工	1	式		¥205,743	
7	細 路体(築堤)盛土	1800	m3	159	¥205,743	
8	種 路床盛土工	1	式		¥237,825	
9	細 路床盛土	1000	m3	238	¥237,825	
10	種 路肩盛土工	1	式		¥147,357	
11	細 路肩盛土	700	m3	211	¥147,357	
12	種 法面整形工	1	式		¥687,840	
13	細 法面整形(切土部)	500	m2	861	¥430,290	
14	細 法面整形(盛土部)	500	m2	515	¥257,350	
15	工 法面工	1	式		¥227,700	
16	種 植生工	1	式		¥227,700	
17	細 植生シート	300	m2	759	¥227,700	
18	工 排水構造物工	1	式		¥4,363,492	
19	種 作業土工	1	式		¥693,831	
20	細 床掘り	200	m3	1,851	¥370,112	
21	細 埋戻し	100	m3	3,237	¥323,719	
22	種 側溝工	1	式		¥3,180,268	
23	細 プレキャストU型側溝	120	m	6,917	¥830,076	300*300
24	細 プレキャストU型側溝	100	m	7,716	¥771,600	400*400
25	細 プレキャストU型側溝	50	m	10,779	¥538,952	400*600
26	細 プレキャストU型側溝	20	m	12,142	¥242,840	PU300*600

材料 ¥68,645 労務 ¥12,360 機械 ¥14,480 外注 ¥0 経費 ¥0

行追加 行削除 コピー 貼付け

資材 0159 参照 軽油 バトロール給油小型ローラー

取引先 参照

単位 ㍓


単価 131

数量 71.40

合計 ¥9,353

費目	コード	名称	単位	単価	数量	金額
材料	0159	軽油 バトロール給油小...	㍓	131	71.40	¥9,353
材料	0160	調整額	式	59,292	1.00	¥59,292
労務	0063	特殊運転手 8時間当り	人	20,600	0.60	¥12,360
機械	0072	バックホウ(クローラ型)...	供用日	18,100	0.80	¥14,480

## 【2. 実行予算の作成】



「単価一括更新」から実行予算の単価に変更できます。

下図を参考に単価を入力してください。

要素変更

番号	属性	コード	名称	単位	単価	変更単価
1	材料	0159	軽油 パトロール給油小型ローリー	リットル	131	110
2	材料	0160	調整額	式	59,292	0
3	材料	0167	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	リットル	119	130
4	材料	0161	再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	1,900	1,500
5	材料	0168	千葉県型側溝 歩道用300×300×2000	本	7,760	7,000
6	材料	0169	千葉県型側溝 歩道用400×400×2000	本	10,300	9,000
7	材料	0170	千葉県型側溝 歩道用400×600×2000	本	14,100	12,000
8	材料	0171	千葉県型側溝 歩道用300×600×2000	本	13,200	11,000
9	材料	0172	道路用Co製品側溝心た路側用千葉県型 CHL25...	枚	1,160	1,000
10	材料	0173	道路用Co製品側溝心た路側用千葉県型 CHL25...	枚	1,740	1,500
11	材料	0174	生コンクリート 18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>	10,600	10,000
12	材料	0175	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用) 600×600用...	組	24,800	22,000
13	材料	0176	再生粒度調整砕石 RM-40	m <sup>3</sup>	2,600	2,200
14	材料	0177	アスファルト合材(溶融スラグ入り) 再生密粒...	t	11,200	10,000
15	材料	0178	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	リットル	91	90
16	労務	0063	特殊運転手 8時間当り	人	20,600	15,000
17	労務	0065	普通作業員 8時間当り	人	16,900	12,000
18	労務	0066	土木一般世話役 8時間当り	人	21,400	15,000
19	労務	0067	特殊作業員 8時間当り	人	19,000	15,000
20	労務	0068	型わく工 8時間当り	人	22,600	15,000
21	機械	0072	バックホウ(クローラ型) 標準山0.8m <sup>3</sup> 平0.6m <sup>3</sup> ...	供用日	18,100	12,000
22	機械	0075	ブルドーザ 普通15t級13~16t排対1次	供用日	19,100	15,000
23	機械	0081	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回山0.28...	供用日	8,040	8,000
24	機械	0082	タイヤローラ 普通型質量8~20t排対1次	供用日	11,000	9,000
25	機械	0083	モータグレーダ 土工用ブレード幅3.1m排対1次	供用日	15,500	10,000
26	機械	0079	ロードローラ マカダム質量10~12t締固め幅2...	供用日	11,900	10,000
27	機械	0080	アスファルトフィニッシャ ホイール型舗装幅...	供用日	40,100	35,000
28	外注	0001		日	4,485	
29	外注	0005		m <sup>2</sup>	759	
30	外注	0006		日	471	
31	外注	0002		m	2,452	

キャンセル 実行

## 【2. 実行予算の作成】

22		種	側溝工	1	式
23		細	プレキャストU型側溝	120	m
24		細	プレキャストU型側溝	100	m
25		細	プレキャストU型側溝	50	m
26		細	プレキャストU型側溝	20	m
27		細	側溝蓋	240	枚
28		細	側溝蓋	150	枚
29		種	集水桝・マンホール工	1	式
30		細	現場集水桝	6	箇所

現場の施工体制に応じて、予算の内容を変更することができます。

【例】側溝工(プレキャストU型側溝)を外注ではなく、直営で行う場合。

まず、23行目の「プレキャストU型側溝」をクリックします。

費目「外注」の行を選択し、「行削除」を行います。

費目	コード	名称	単位	単価	数量	金額
材料	0161	再生クラッシャーラン...	m3	1,500	5.76	¥8,640
材料	0168	千葉県型側溝 歩道用3...	本	7,000	60.00	¥420,000
材料	0160	調整額	式	0	1.00	¥0
外注	0002		m	2,452	120.00	¥294,240

費目「外注」の行を選択し、「行削除」を行います。

次に「労務」ボタンを押してから、「行追加」を行います。

費目	コード	名称	単位	単価	数量	金額
材料	0161	再生クラッシャーラン...	m3	1,500	5.76	¥8,640
材料	0168	千葉県型側溝 歩道用3...	本	7,000	60.00	¥420,000
労務						

次に「労務」ボタンを押してから、「行追加」を行います。



## 【2. 実行予算の作成】

材料 ¥428,640 労務 ¥96,000 機械 ¥0 外注 ¥0 経費 ¥0

行追加 行削除 コピー 貼付け

労務  普通作業員

単位 人

単価 12,000

数量 8.00

合計 ¥96,000

労務の名称(ここでは普通作業員)、単位、単価、数量を入力します。

材料 ¥428,640 労務 ¥156,000 機械 ¥0 外注 ¥0 経費 ¥0

行追加 行削除 コピー 貼付け

労務  世話役

単位 人

単価 15,000

数量 4.00

合計 ¥60,000

同様に、行を追加し、別の項目を追加します(ここでは労務～「世話役」を追加)

費目	コード	名称	単位	単価	数量	金額
材料	0161	再生クラッシャーラン...	m3	1,500	5.76	¥8,640
材料	0168	千葉貝型側溝 歩道用3...	本	7,000	60.00	¥420,000
労務		普通作業員	人	12,000	8.00	¥96,000
労務		世話役	人	15,000	4.00	¥60,000

費目	コード	名称	単位
材料	0161	再生クラッシャーラン...	m3
材料	0168	千葉貝型側溝 歩道用3...	本
労務		普通作業員	人
労務		世話役	人

材料 行追加  
 労務 行追加  
 機械 行追加  
 外注 行追加  
 経費 行追加  
 行削除

材料 ¥428,640 労務 ¥156,000 機械 ¥72,000 外注 ¥0 経費 ¥0

行追加 行削除 コピー 貼付け

機械  クレーン仕様バックホウ

区分

取引先

単位 台

単価 12,000

数量 6.00

合計 ¥72,000

機械を追加する場合は、「機械」ボタンを押した後、「行追加」を行ってください。

※行を右クリックで「材料」「労務」「機械」「外注」「経費」の行を追加することもできます。

その後、機械の名称(ここではクレーン仕様バックホウ)、単位、単価、数量を入力します。

費目	コード	名称	単位	単価	数量	金額
材料	0161	再生クラッシャーラン...	m3	1,500	5.76	¥8,640
材料	0168	千葉貝型側溝 歩道用3...	本	7,000	60.00	¥420,000
材料	0160	調整額	式	0	1.00	¥0
労務		普通作業員	人	12,000	8.00	¥96,000
労務		世話役	人	15,000	4.00	¥60,000
機械		クレーン仕様バックホウ	台	12,000	6.00	¥72,000

## 【2. 実行予算の作成】

直接工事費の作成が終了後、経費の作成を行います。

一番下の行を選択している状態で、画面上「項目追加」をクリックしてください。

番号	費目/工種/種別/細別	数量	単位	単価	合計
9	細 路床盛土	1000	m3	138	¥138,000
10	種 路肩盛土工	1	式		¥68,247
11	細 路肩盛土	700	m3	97	¥68,247
12	種 法面整形工	1	式		¥408,455
13	細 法面整形(切土部)	500	m2	532	¥265,880
14	細 法面整形(盛土部)	500	m2	285	¥142,575
15	種 法面工	1	式		¥227,700
16	種 植生工	1	式		¥227,700
17	細 植生シート	300	m2	759	¥227,700
18	種 排水構造物工	1	式		¥3,341,322
19	種 作業土工	1	式		¥450,109
20	細 床掘り	200	m3	1,231	¥246,160
21	細 埋戻し	100	m3	2,039	¥203,949
22	種 側溝工	1	式		¥2,598,460
23	細 プレキャストU型側溝	120	m	4,872	¥584,640
24	細 プレキャストU型側溝	100	m	7,042	¥704,200
25	細 プレキャストU型側溝	50	m	8,524	¥426,200
26	細 プレキャストU型側溝	20	m	8,051	¥161,020
27	細 側溝蓋	240	枚	1,660	¥398,400
28	細 側溝蓋	150	枚	2,160	¥324,000
29	種 集水柵・マンホール工	1	式		¥292,753
30	細 現場打ち集水柵	6	箇所	24,530	¥147,177
31	細 蓋	6	枚	24,263	¥145,576
32	種 舗装工	1	式		¥4,237,110
33	種 アスファルト舗装工	1	式		¥4,237,110
34	細 下層路盤(車道・路...	1800	m2	452	¥813,186
35	細 上層路盤(車道・路...	1800	m2	478	¥859,626
36	細 表層(車道・路肩部)	1800	m2	1,425	¥2,564,298

項目追加

- 斜面对策
- 道路改良
- 舗装
- 鋼橋上部
- コンクリート橋上
- 橋梁下部
- トンネル(NATM)
- トンネル(矢板)
- コンクリートフェン
- 鋼製シェッド
- 共同溝
- 電線共同溝
- 道路修繕
- 道路維持
- 雪害
- 橋盤整備
- 植栽
- 施設整備
- グラウンドコート
- 自然育成
- 全上層共通
- 共通仮設

共通仮設

共通仮設費

OK 決定 戻る

「項目追加」ウィンドウが開きます。

ツリー項目にチェックを入れて、予算入力画面に反映させることが可能です。

## 【2. 実行予算の作成】



「項目追加」ウィンドウ左下の「共通仮設」より、運搬費、準備費、安全費などの項目を追加します。

項目番号	項目名	単位	数量	単価	金額
37	共通仮設費	1 式			¥880,000
38	種 運搬費	1 式			¥100,000
39	細 建設機械運搬費	1 式		100,000	¥100,000
40	種 準備費	1 式			¥240,000
41	細 木根等処分費	1 式		240,000	¥240,000
42	種 安全費	1 式			¥540,000
43	細 交通整理員	1 式		300,000	¥300,000
44	細 安全管理員	1 式		240,000	¥240,000

チェックを入れた項目が下の行に追加されます。

材料	労務	機械	外注	経費
¥0	¥300,000	¥0	¥0	¥0

行追加	行削除	コピー	貼付け
-----	-----	-----	-----



参照 交通誘導員  
 単位 人  
 単価 10,000  
 数量 30.00  
 合計 ¥300,000

費目	コード	名称	単位	単価	数量	金額
労務		交通誘導員	人	10,000	30.00	¥300,000

直接工事費の場合と同様に、材料・労務・機械・外注・経費に分けて、予算を計上してください。

# 【3. 日報(実績数量)の入力】

機能選択より「日報入力」に切り替えます。

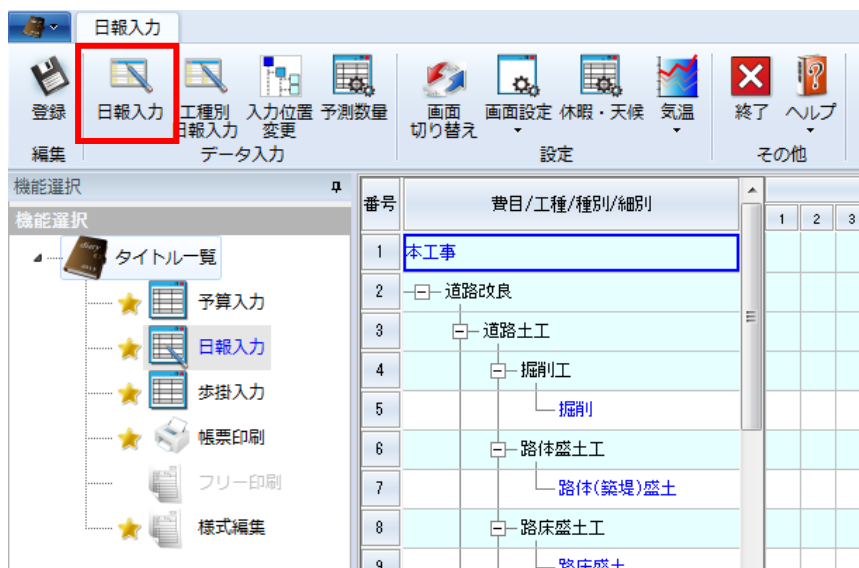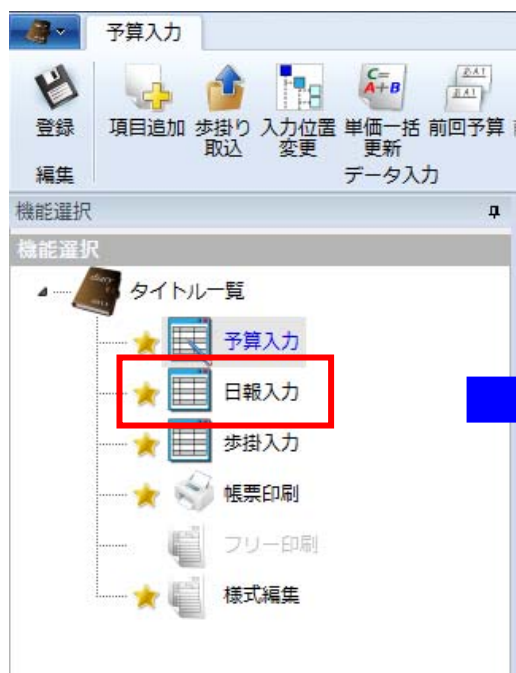


## 【日報入力時の日付について】

当日の日報を入力する場合は、画面上「日報入力」をクリックしますが、遡って過去の日報を入力したい場合などは、該当する日付の列をダブルクリックします。

番号	費目/工種/種別/細別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	本工事																
2	道路改良																
3	道路土工																
4	掘削工																
5	掘削																
6	路体盛土工																
7	路体(築堤)盛土																
8	路床盛土工																
9	路床盛土																
10	路肩盛土工																
11	路肩盛土																
12	法面整形工																
13	法面整形(切土部)																
14	法面整形(盛土部)																
15	法面工																
16	植生工																

子算合計	¥26,454	合計	子算	実績	材料	子算	実績	労務	子算	実績	機械	子算
実績合計	¥0	子算	¥26,454	実績	¥0	¥7,854	¥0	¥9,000	¥0	¥9,600	¥0	¥9,600
子算残高	¥26,454	100.0%			29.7%			34.0%				38.3%
進捗率	0.00%			0.0%				0.0%				

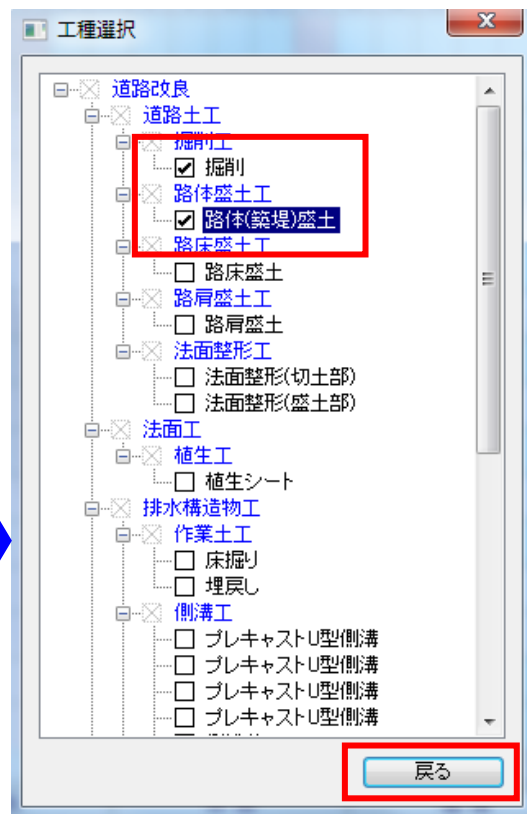

「日報入力」または日付の列をダブルクリックすると、「工種選択」ウィンドウが開くので、作業を行った工種にチェックを入れてください。

### 【3. 日報(実績数量)の入力】

まず、当日の作業内容・工種別出来高を入力します。

工種行を選択した後、出来高数量もしくは進捗率を入力してください。

日報入力

日付 H27/04/06 月曜日 工種選択

作業内容 材料 労務 機械 外注 経費

工種 道路改良-道路土工-路体盛土工-路体(築堤)盛土

作業内容 路体(築堤)盛土

出来高 300.00 累計 300.00 予定 1,800 m3

進捗率 16.67 累計 16.67 %

No	工種	作業内容	出来高	累計	進捗率	累計
1	掘削(200m3)	掘削	100.00	100.00	50.00	50.00
2	路体(築堤)盛土(1800m3)	路体(築堤)盛土	300.00	300.00	16.67	16.67

予算 履歴 登録 工種削除 集計 戻る

次に、実績数量を入力します。

ウィンドウ左下の「予算」ボタンから「予算表示」をクリックしてください。

日報入力

日付 H27/04/06 月曜日 工種選択

作業内容 材料 労務 機械 外注 経費

工種選択 行追加 行削除

労務 参照

1日当り単価

1日当り人数

合計

No	工種選択	J-T*	労務名

予算 履歴 登録 工種削除 集計 戻る

予算表示

工種	区分	J-T*	名称	単位	単価
掘削(200m3)	材料	0159	軽油 バトロール給油小...	畧	110
"	"	0160	調整額	式	0
"	労務	0063	特殊運転手 8時間当り	人	15,000
"	機械	0072	バックホウ(クローラ型) ...	供用日	12,000
路体(築堤)盛...	材料	0159	軽油 バトロール給油小...	畧	110
"	"	0160	調整額	式	0
"	労務	0063	特殊運転手 8時間当り	人	15,000
"	"	0065	普通作業員 8時間当り	人	12,000
"	機械	0075	ブルドーザ 普通15t級13...	供用日	15,000

追加 閉じる

## 【3. 日報(実績数量)の入力】

予算表示

工程	区分	コード	名称	単位	単価	数量
掘削(200m3)	材料	0159	軽油 パトロール給油小...	㍈	110	71.40
"	"	0160	調整額	式	0	1.00
"	労務	0063	特殊運転手 8時間当り	人	15,000	0.60
"	機械	0072	バックホウ(クローラ型)...	供用日	12,000	0.80
路体(築堤)盛...	材料	0159	軽油 パトロール給油小...	㍈	110	343.80
"	"	0160	調整額	式	0	1.00
"	労務	0063	特殊運転手 8時間当り	人	15,000	3.60
"	"	0065	普通作業員 8時間当り	人	12,000	1.80
"	機械	0075	ブルドーザ 普通15t級13...	供用日	15,000	3.60
"	外注	0001		日	4,485	1.80

追加 閉じる

「予算表示」ウィンドウ内で、当日に発生した材料・労務・機械等の項目を選択します。

キーボードのShiftキー、もしくはCtrlキーを押しながら、まとめて選択することが可能です。

選択が完了したら「追加」ボタンを押してください。

日報入力

日付 H27/04/06 月曜日 工種選択

作業内容 材料 労務 機械 外注 経費

材料 ¥0 労務 ¥27,000 機械 ¥0 外注 ¥0 経費 ¥0

工種選択 路体(築堤)盛土(1800m3) 行追加 行削除

労務 0065 参照 普通作業員 8時間当り

1日当り単価 12,000  
1日当り人数 1.00  
合計 ¥12,000

No	工種選択	コード	労務名	1日当り単価	1日当り人数
1	掘削(200m3)	0063	特殊運転手 8時間当り	15,000	0.50
2	路体(築堤)盛...	0063	特殊運転手 8時間当り	15,000	0.50
3	路体(築堤)盛...	0065	普通作業員 8時間当り	12,000	1.00

当日の作業に該当する項目(材料・労務・機械・外注・経費)が反映されているので、実績数量を入力してください。

なお、予算に計上されていない材料や機械が発生した場合は、「行追加」を行い、実績の単価・数量を入力可能です。

作業内容 材料 労務 機械 外注 経費

材料 ¥11,000 労務 ¥27,000 機械 ¥27,000 外注 ¥0 経費 ¥0

工種選択 路体(築堤)盛土(1800m3) 行追加 行削除

資材 0159 参照 軽油 パトロール給油小型ローリー

取引先 参照

単位 ㍈  
単価 110  
数量 50.00  
合計 ¥5,500

No	工種選択	J...	資材名	J...	取引先名	単位
1	掘削(200m3)	0159	軽油 パトロール給油小...			㍈
2	路体(築堤)盛...	0159	軽油 パトロール給油小...			㍈

予算 履歴 登録 工種削除 集計 戻る

同様にして、材料や機械の実績数量も入力します。

入力が完了したら「戻る」ボタンを押してください。

## 【4. 確認画面】

選択している工種の予算金額と実績金額が表示されます。

画面左下「進捗率を考慮する」ボタンを押すと、日報入力時の進捗率を考慮した予算金額と実績金額の表示になります。

番号	費目/工種/種別/細別	平成27年4月																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	本工事																		
2	道路改良																		
3	道路土工																		
4	掘削工																		
5	掘削																		
6	路体盛土工																		
7	路体(築堤)盛土																		
8	路床盛土工																		
9	路床盛土																		
10	路肩盛土工																		
11	路肩盛土																		
12	法面整形工																		
13	法面整形(切土部)																		
14	法面整形(盛土部)																		
15	法面工																		
16	植生工																		

予算合計	¥9,604,779	合計		材料		労務		機械	
実績合計	¥65,000	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
予算残高	¥9,539,779	¥9,604,779	¥65,000	¥5,984,466	¥11,000	¥2,105,400	¥27,000	¥485,400	¥27,000
進捗率	2.67%	100.0%	0.7%	62.3%	0.2%	21.9%	1.3%	5.1%	5.6%
<input type="button" value="進捗率を考慮する"/>									



予算合計	¥9,604,779	合計		材料		労務		機械	
実績合計	¥65,000	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
予算残高	¥9,539,779	¥256,140	¥65,000	¥159,594	¥11,000	¥56,147	¥27,000	¥12,945	¥27,000
進捗率	2.67%	2.7%	25.4%	1.7%	6.9%	0.6%	48.1%	0.1%	208.6%
<input type="button" value="進捗率を考慮する"/>									
